





BYGGHERRE
RÅDGIVEREN

Leangen Sentrum - Leangenvegen

Faseplaner fremdrift infrastruktur


Utklipp plankart (regulering)

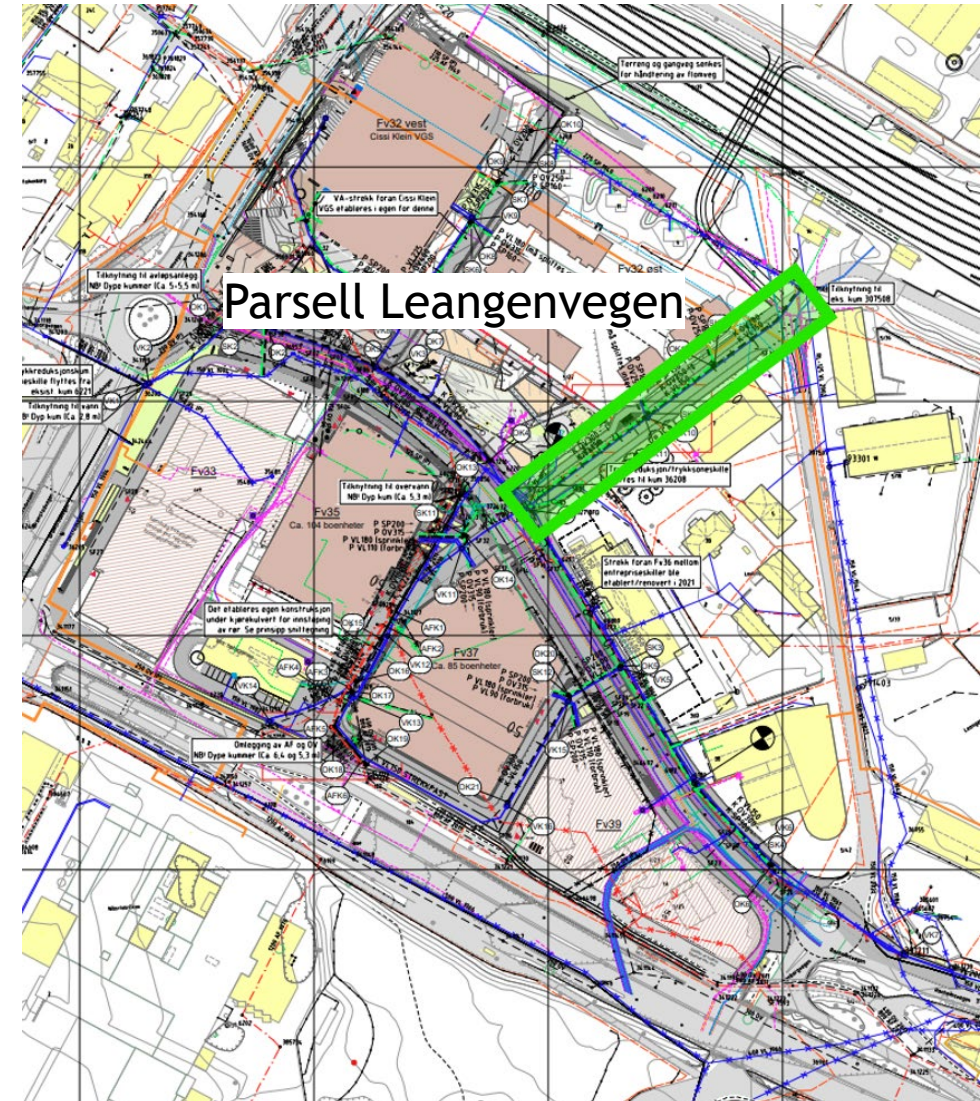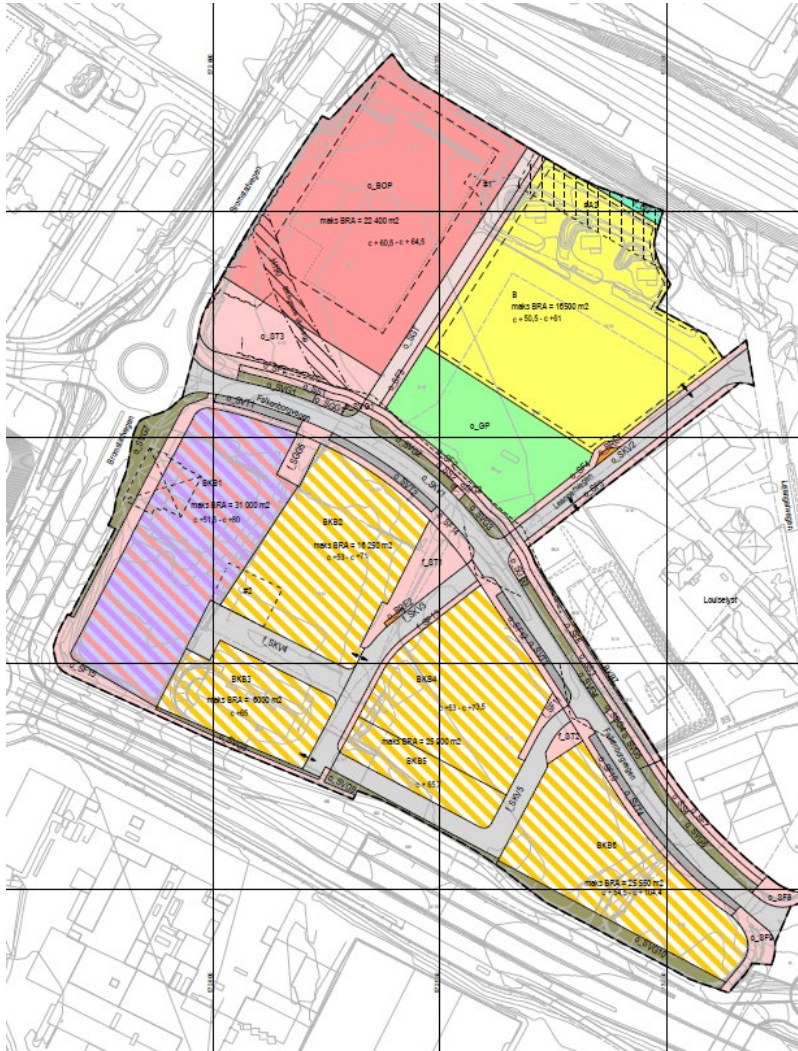


03.12.2025

Fase 1 Rigging etappe 1; områdesikring og skilting

Prognose gjennomføring:
uke 50-2025

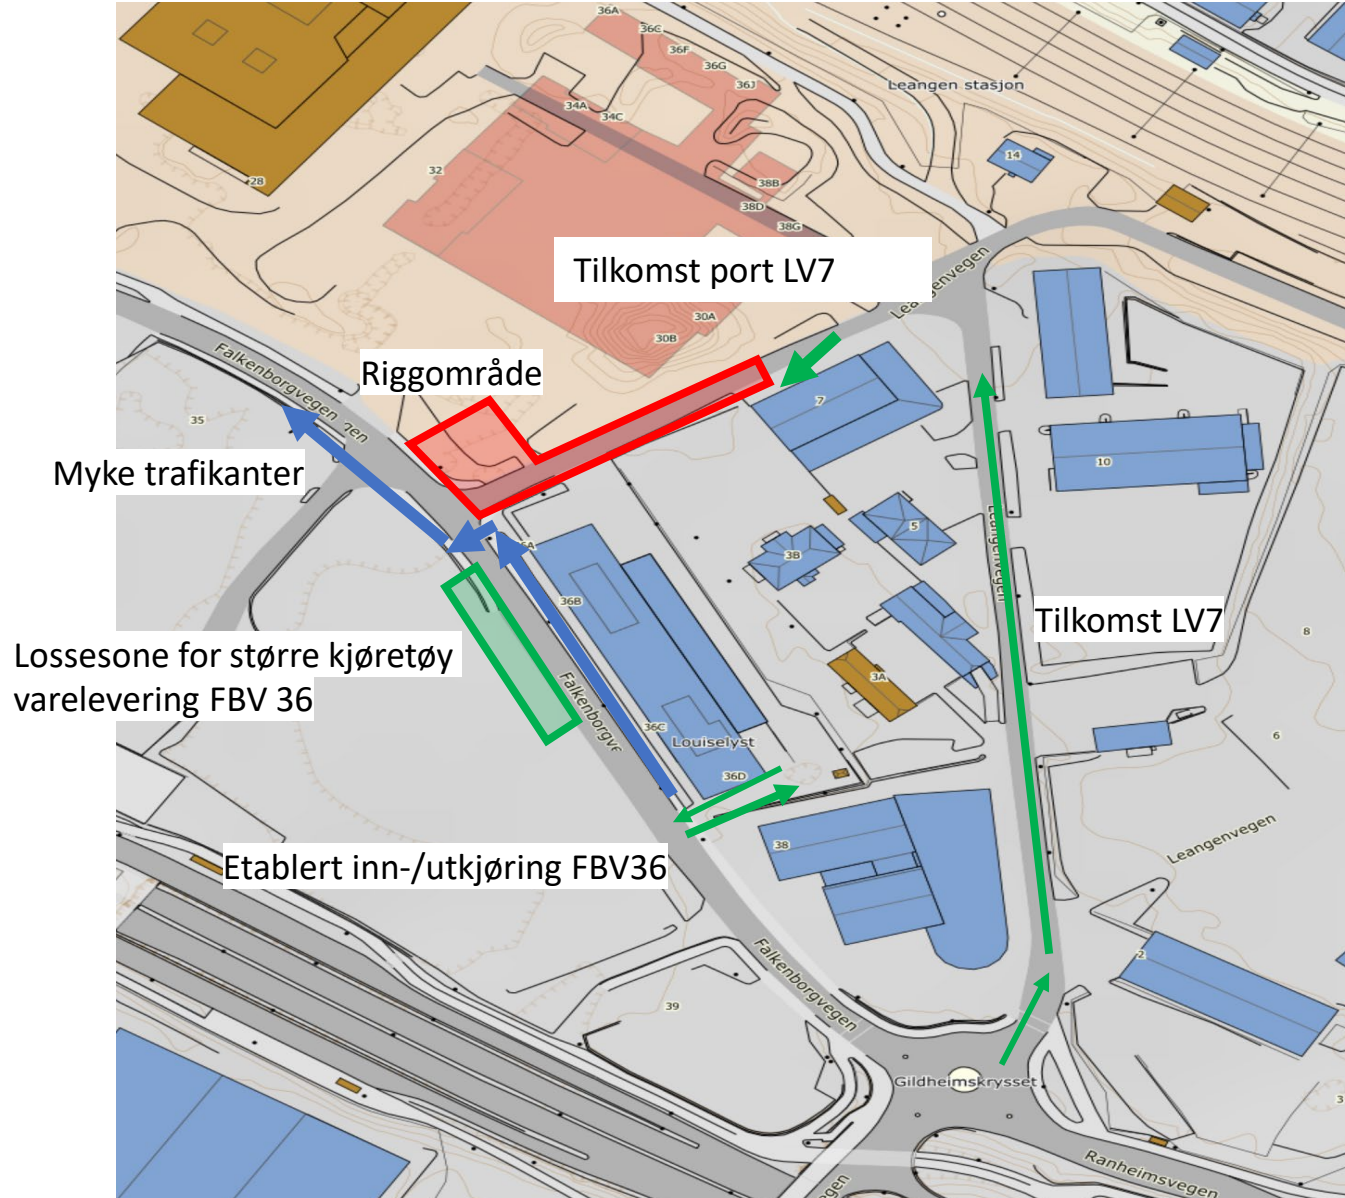


Utklipp godkjent arbeidsvarslingsplan

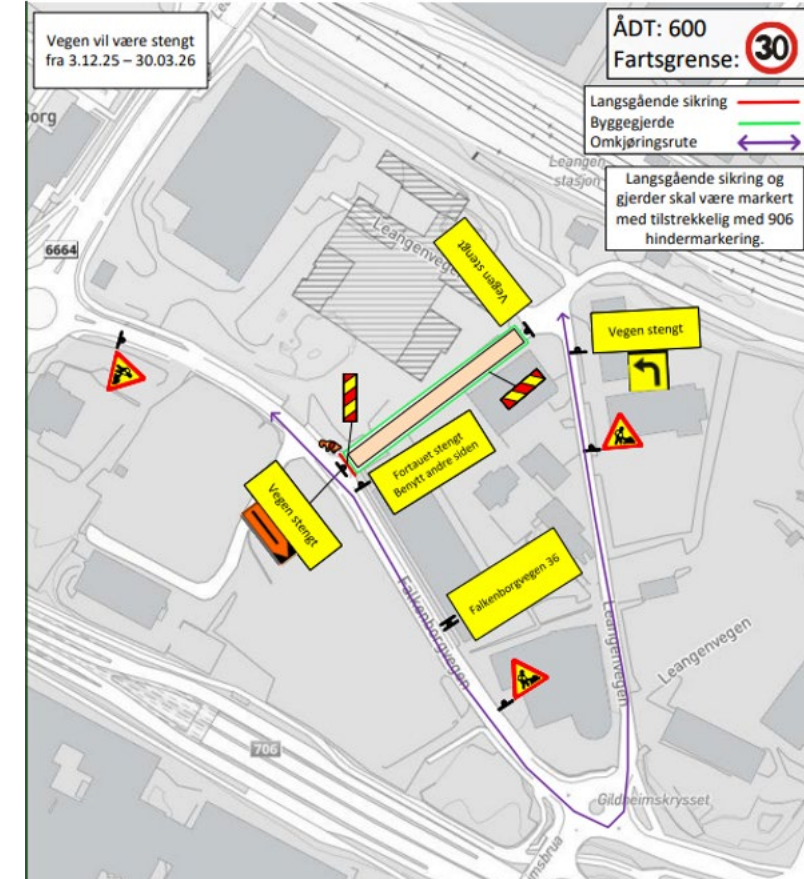

- Det foreligger godkjent arbeidsvarslingsplan (skilting)
- Br Bjerkli bistår lossing av større kjøretøy. Det benyttes da hullaster med pallegaffel
- Området markert blir stengt i sin helhet gjennom hele fase 1 og fase 2.
- Inn-/utkjøring til FBV36 etableres. Vises med skilting.

Fase 2 Utførelse etappe 1

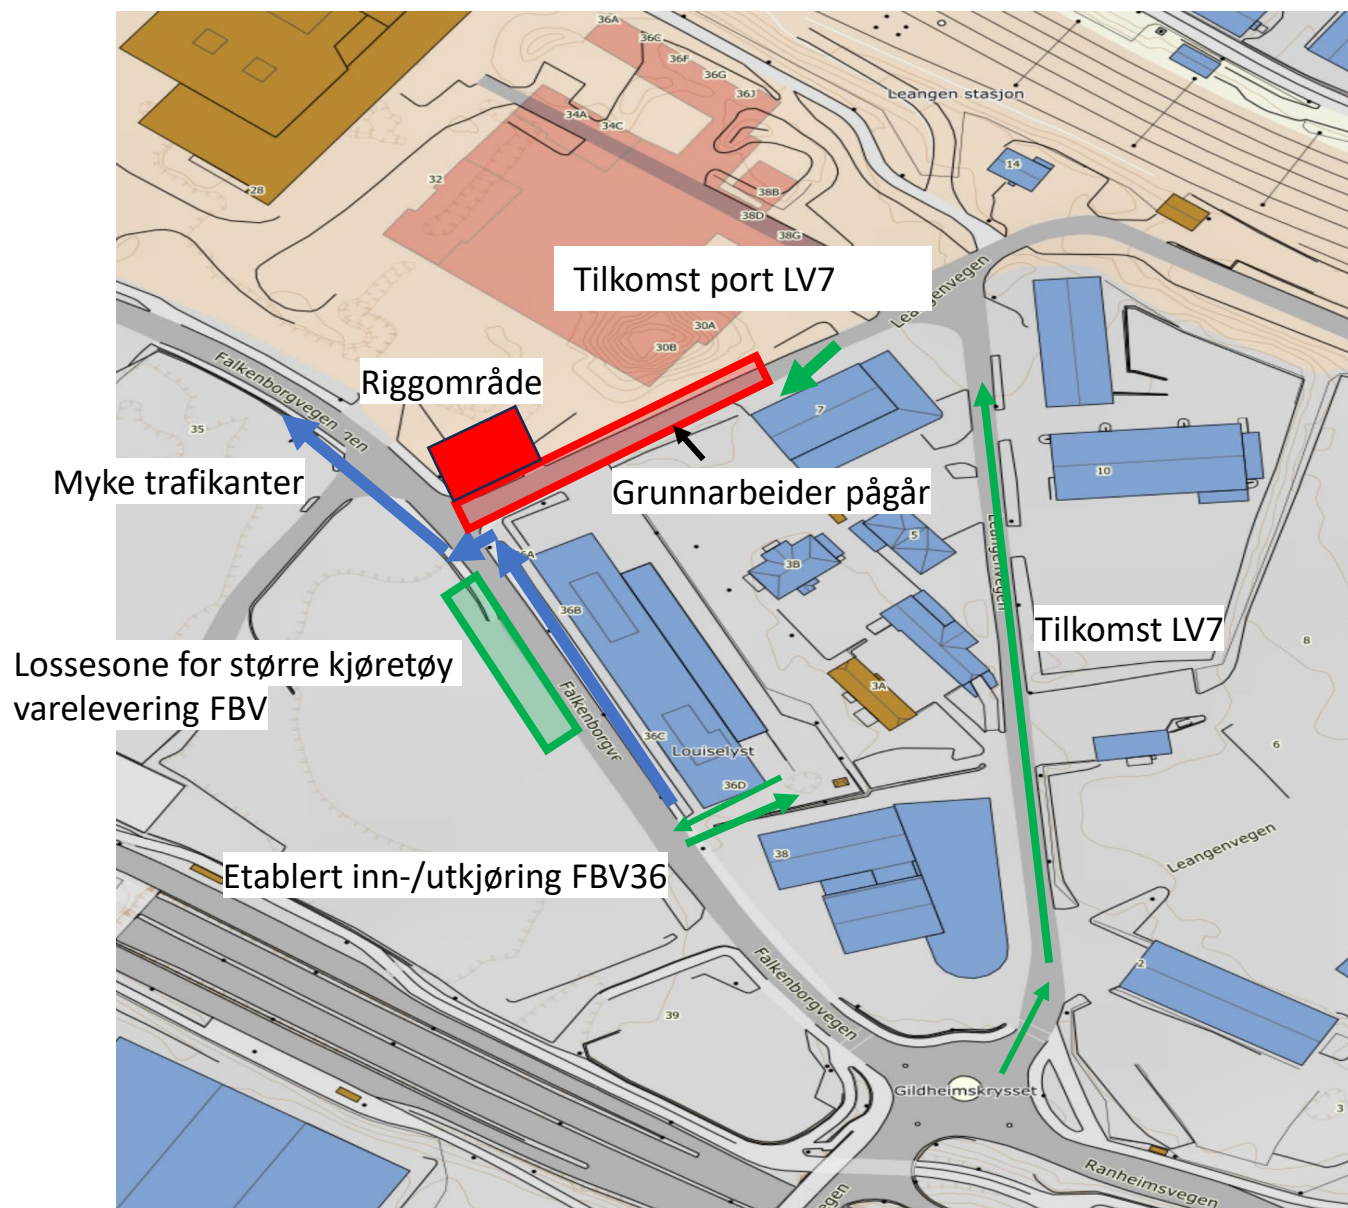

Prognose gjennomføring:
uke 50 – uke 5 (2026)




- Oppstart etter tilrigging.

Prognose gjennomføring:
uke 50 – uke 5 (2026)



Fase 3 Utførelse etappe 2

Prognose gjennomføring:
uke 5 – uke 11 (2026)

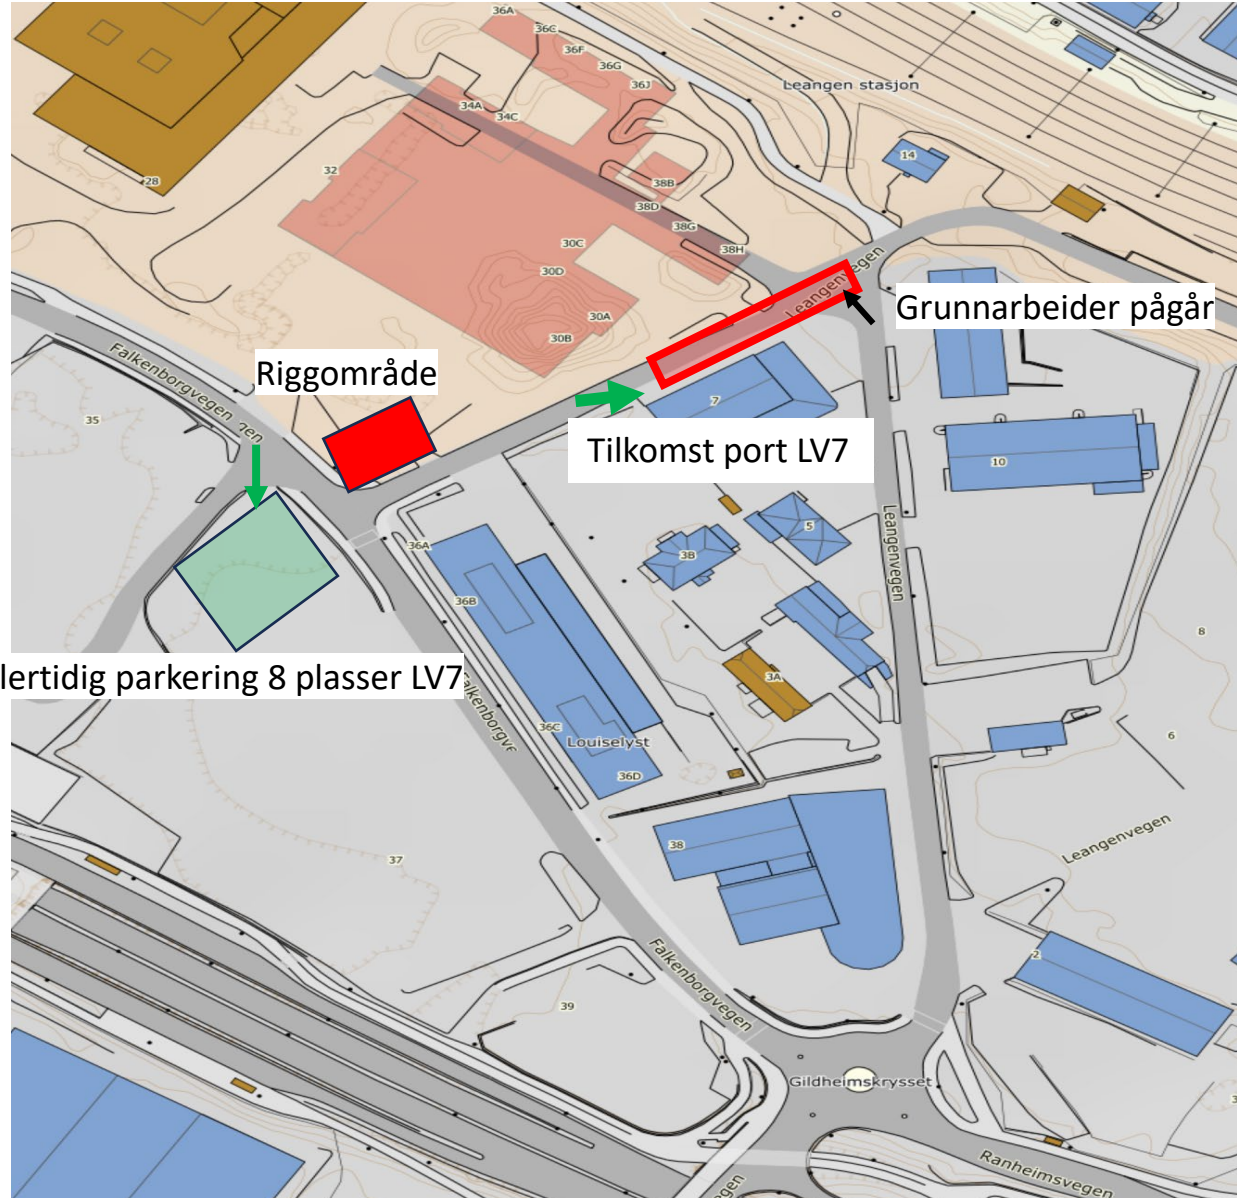


Midlertidig parkering 8 plasser LV7

- Areal merket  blir stengt i sin helhet i perioden
- Midlertidig parkering for LV7 etablert på FBV37
- Begrenset tilkomst til LV7 via Leangenvegen.

Fase 3 Utførelse etappe 2 forts.

Prognose gjennomføring:
uke 5 – uke 11 (2026)

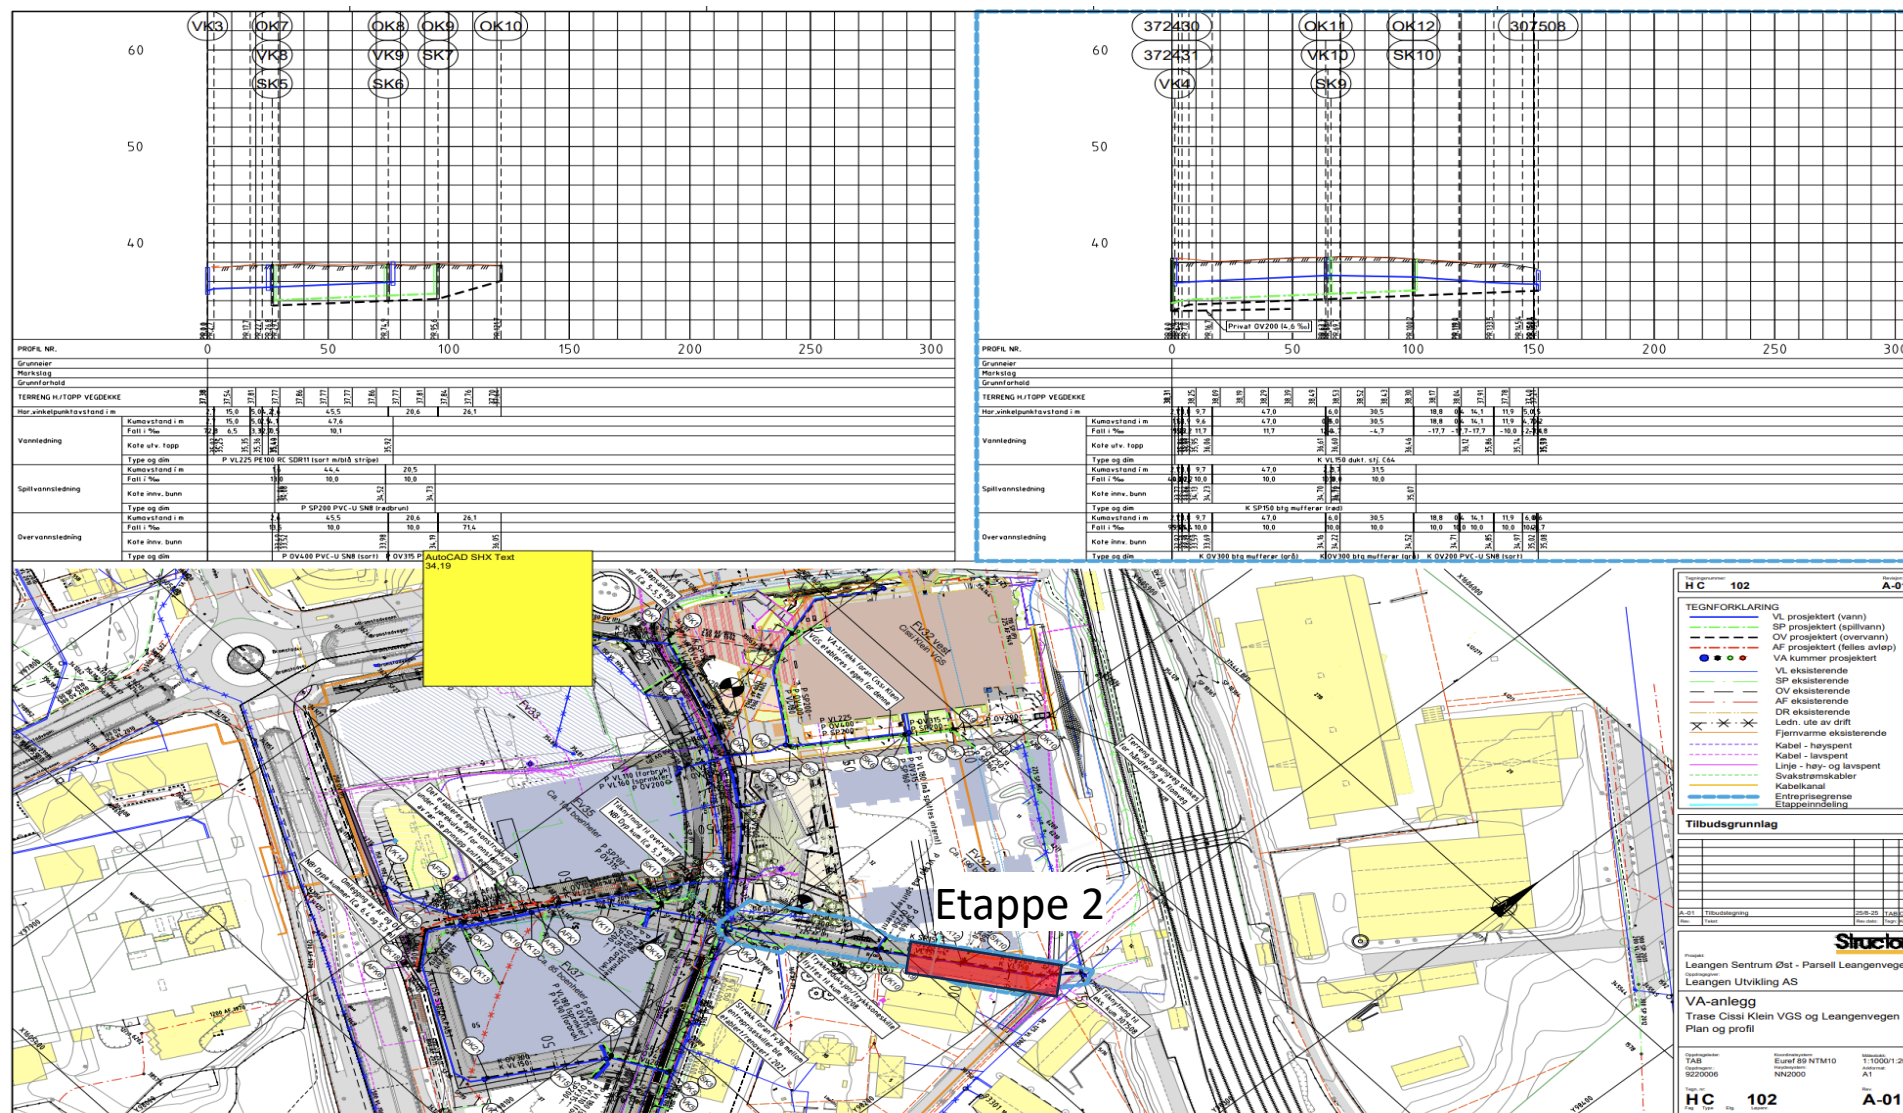

Fase 4 Asfaltering

Prognose gjennomføring:

uke 16 -2026 (utførelse 1-2 dager. Angis nærmere)

- Hele Leangenvegen blir stengt. Varighet og eksakt dato vil informeres om i god tid i forkant. Antatt 2 dager stengt.

